


改築レター

(仮称) 北区立 都の北学園

工事へのご協力ありがとうございます

(仮称) 北区立都の北学園は、令和5年12月の竣工に向けて、順調に工事を進めております。近隣の皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。今回の改築レターでは、現在の工事現場の様子をお知らせいたします。



工事現場の様子

こちら南校舎の
定点写真でございます



①令和3年7月



②令和4年2月



③令和4年9月



④令和5年5月



こちら令和5年7月時点の
工事ギャラリーでございます



北校舎プール屋根

開閉式の屋根があるプールは
夏季に1年生から9年生までが
余裕をもって活動できます。




北校舎メインアリーナ

メインアリーナ（体育館）は
現在、足場解体中でございます。



渡り廊下

北校舎と南校舎の
3階をつなぐ
渡り廊下の形が
見えてきました。

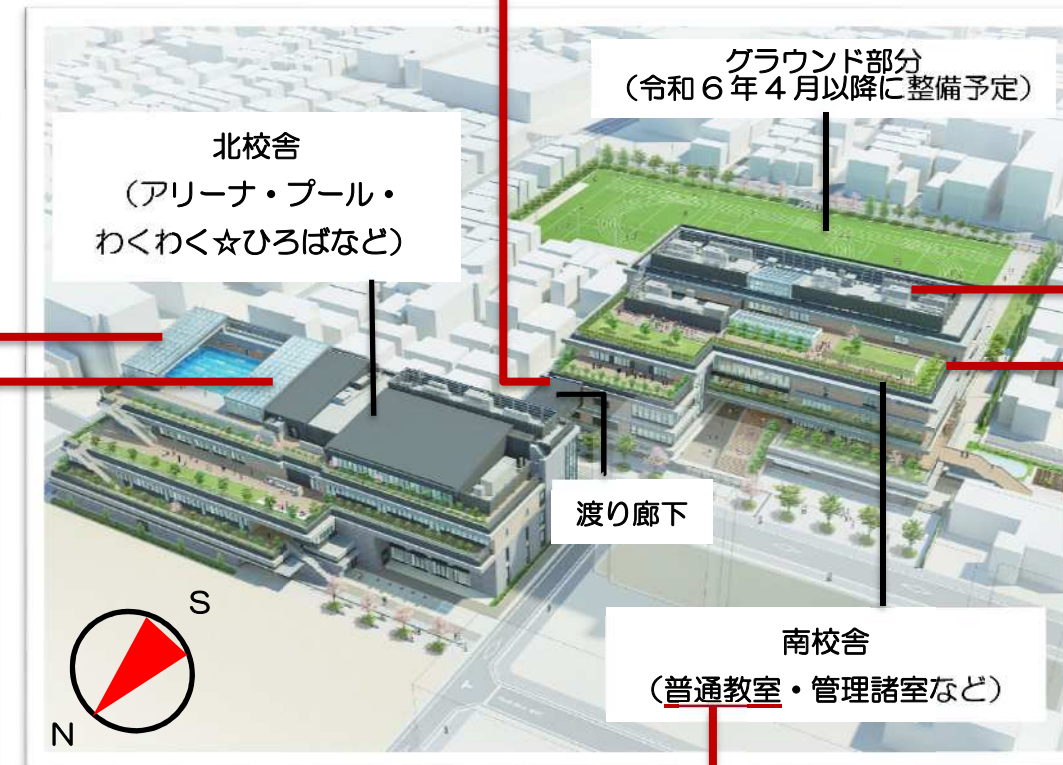

北校舎
(アリーナ・プール・
わくわく☆ひろばなど)

グラウンド部分
(令和6年4月以降に整備予定)

渡り廊下

南校舎
(普通教室・管理諸室など)

木材を多く使用しており、
温もりを感じる
普通教室となっております。



普通教室



南校舎5階廊下

南校舎最上階である5階の廊下です。
天井は工事のため、配管が見られます。



南校舎外壁(西側)

南校舎西側の足場が解体され
一部、外壁が見えてきました。

工事に関するお知らせ

① 渡り廊下の設置工事について

4月から南校舎と北校舎をつなぐ、渡り廊下の設置工事が始まりました。工事中は道路の通行止め期間が生じ、皆さまにご不便をおかけいたしました。

8月中旬から9月中旬にかけて、土日・祝日を除く9時～18時に、再び通行止めの期間が発生いたしますが、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



渡り廊下

② 開校後に行う グラウンド整備工事スケジュールについて

令和6年4月の開校後に、神谷小学校校舎を解体して行うグラウンド整備工事について、隣接する都有地部分への付属棟の整備が可能となったことや、現在の工事に取り組むなかで確認された地盤状況の悪さや、近接する新校舎の学習環境への影響も踏まえて、より一層丁寧な作業が求められる等、総合的に検討を行った結果、工事完了時期を令和7年6月から令和8年2月に変更することといたしました。なお、グラウンド整備工事完了までの学校運動場（屋外）については、北運動場、稲田小学校の校庭を使用する予定です。

グラウンド整備完了時期

変更前 令和7年6月 → 変更後 令和8年2月（予定）

【今後の予定】

令和5年12月 新校舎建築工事完了（以降、備品搬入等の新校開校準備）

令和6年 4月 北区立都の北学園開校

令和6年 4月～ 令和8年2月 既存校舎解体及びグラウンド整備工事

資料をご覧ください

北区ホームページ「（仮称）都の北学園の改築」



・北区ホームページから

ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校 > 学校の改築・改修 > 学校の改築 > （仮称）都の北学園

【問い合わせ先】

北区教育委員会事務局 教育振興部 学校改築施設管理課 計画係 担当/森・関谷

電話 03-3908-9277 Email g-shisetsu-ka@city.kita.lg.jp
